

揖斐川大村堤防補強工事だより


6月号



5月の半ばには、例年より20日位早い梅雨入りが発表されました。5月は非常に多くの雨が降り、現場の進捗にも大きな影響を与えています。6月の施工予定ですが、階段箇所（水神様前）から順次上流へ施工してまいります。一施工箇所のロットを約30m程度として、掘削→ブロック基礎→ブロック積→PU側溝据付の順で少しずつですが施工していきます。

近隣住民の皆様には交通規制等で大変ご迷惑をお掛け致しますが**安全第一**で工事を行いますので、今月もどうか宜しくお願い致します。

現在の進捗状況

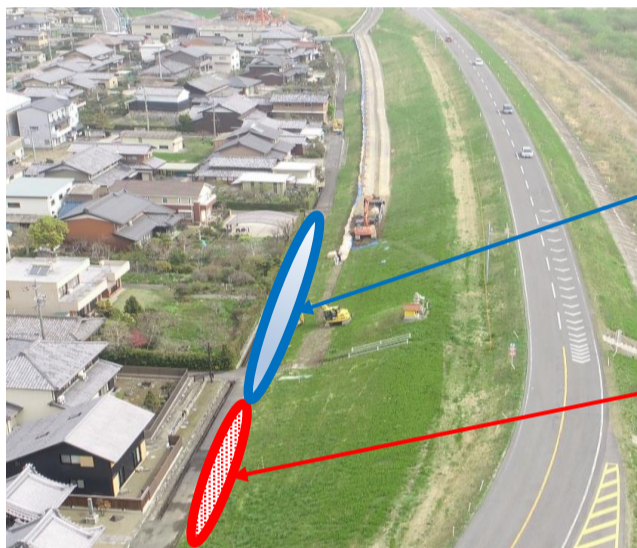

6月施工予定箇所

5月施工箇所
ブロック積・側溝据付完了

施工状況

起点箇所から、約30mまでのブロック積とPU側溝の据付作業が完了いたしました。現場の特性として、非常に狭い場所での作業でしたので思っていたよりも、作業効率が低下して厳しい施工になりましたが、技術者及び各作業員が力を合わせて施工を行い完了する事が出来ました。



5月分施工完了
(起点箇所)

工事概要

発注者 国土交通省 中部地方整備局 木曾川上流河川事務所

施工 株式会社 相岡組

工事名 令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

工期 令和2年12月15日 ~ 令和3年6月30日



河川土工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

堤脚保護工 コンクリートブロック工 A=503㎡ コンクリート基礎L=317m

付帯道路工 As舗装 A=174㎡ PU側溝 L=285m 自由勾配側溝 L=32m 暗渠（1号～6号各1箇所）

堤防強化のため法尻を補強する工事を行っています

令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

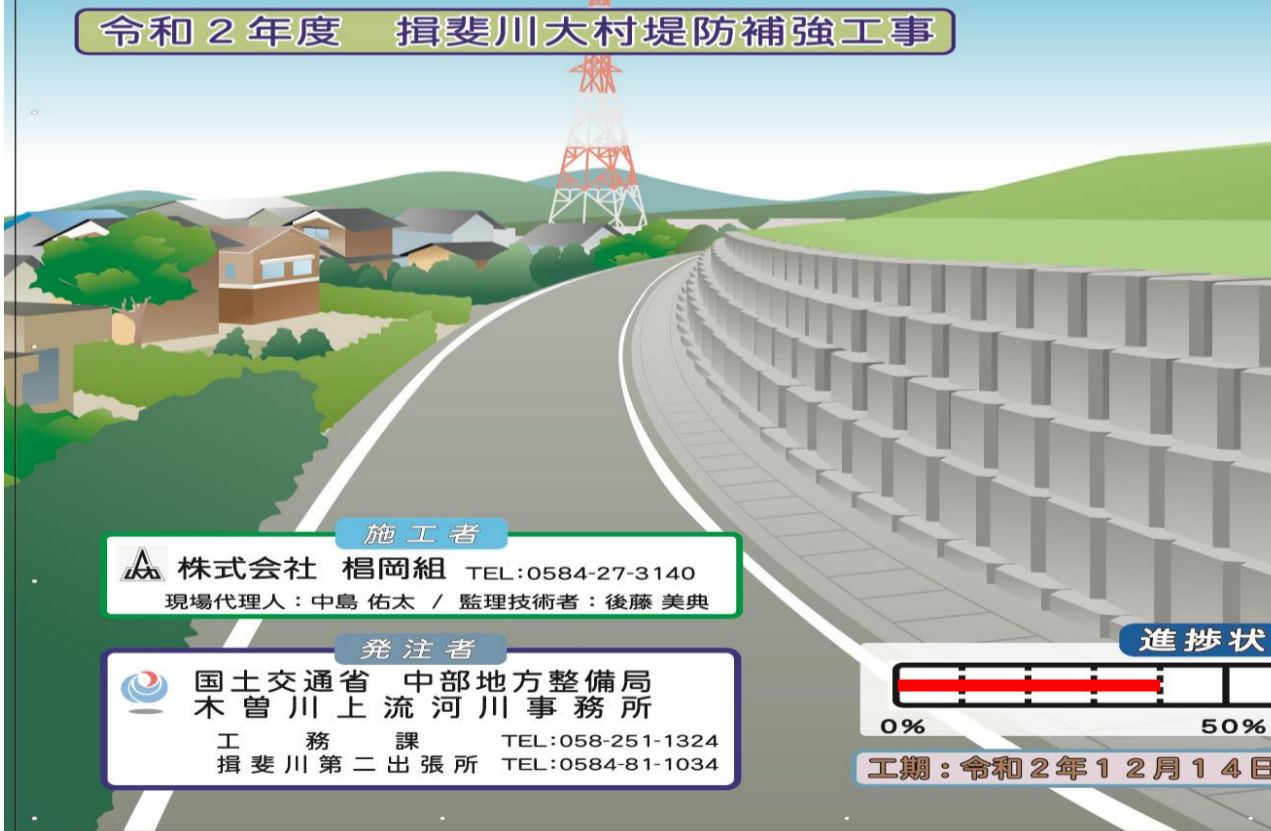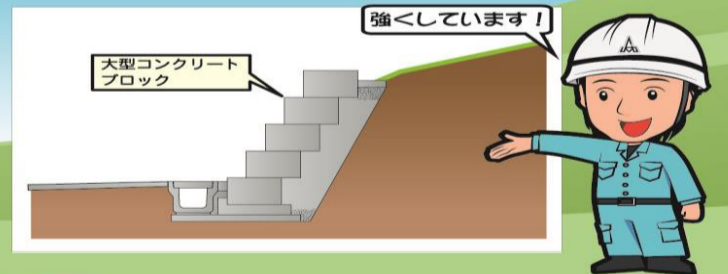


施工者

株式会社 相岡組 TEL:0584-27-3140
現場代理人：中島 佑太 / 監理技術者：後藤 美典

発注者

国土交通省 中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
工務課 TEL:058-251-1324
揖斐川第二出張所 TEL:0584-81-1034

進捗状況



工期：令和2年12月14日～令和3年6月30日
