

揖斐川大村堤防補強工事だより

7月号




6月は梅雨の期間真只中ではありましたが、雨降りの日が比較的少なく順調に現場の施工が出来ました。ただ、蒸し暑い日が多く非常に体力が消耗される為熱中症にならないように、現場ではその対策を十分に実施しています。

7月は、階段設置の完了とその上流個所の施工を行っていきます。また、揖斐川左岸（対岸）の伐木除根が追加され、工期が令和3年12月24日まで延長されました。

近隣住民の皆様には交通規制等で大変ご迷惑をお掛け致しますが安全第一で工事を行いますので、今月もどうか宜しくお願い致します。

現在の進捗状況

施工状況

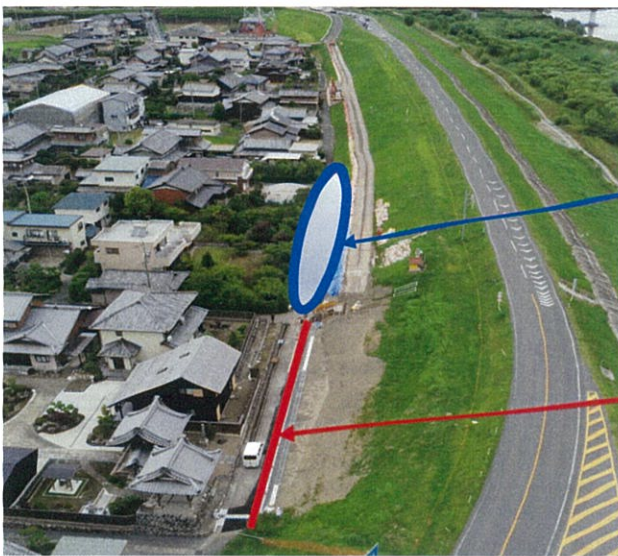

7月施工予定箇所
ブロック積・側溝据付
階段設置

施工完了箇所
ブロック積・側溝据付完了
(一部、舗装は除く)

6月は階段までのブロック積及び側溝の据付を完了し、現在は階段の設置を行いながら、上流部の側溝据付作業を行っています。

7月は随時、その上流へと施工を進めていきます。繰り返しの作業の連続ではありますが、少しずつ現場の景観も変化してきました。



6月分施工完了

工事概要

発注者 国土交通省 中部地方整備局 木曾川上流河川事務所

施工 株式会社 相岡組

工事名 令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

工期 令和2年12月15日 ~ 令和3年12月24日 (伐木除根追加に伴う工期延長)



河川土工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

堤脚保護工 コンクリートブロック工 A=503㎡ コンクリート基礎L=317m

付帯道路工 As舗装 A=174㎡ PU側溝 L=285m 自由勾配側溝 L=32m 暗渠(1号~6号各1箇所)

堤防強化のため法尻を補強する工事を行っています


令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

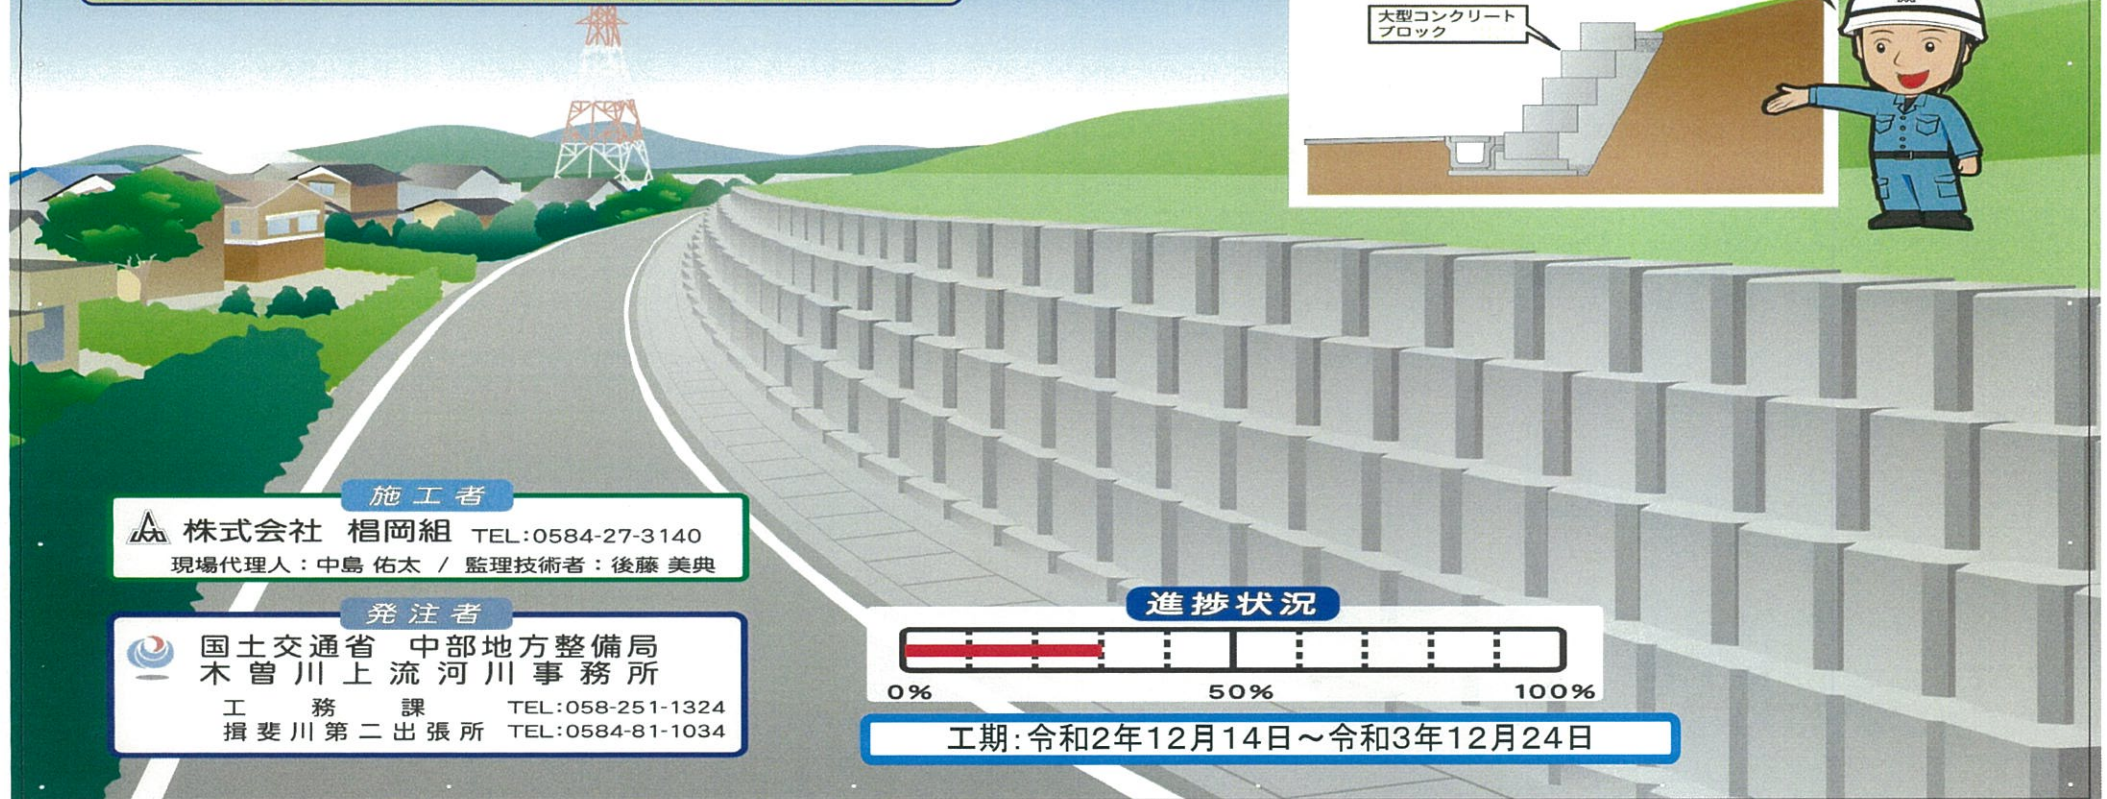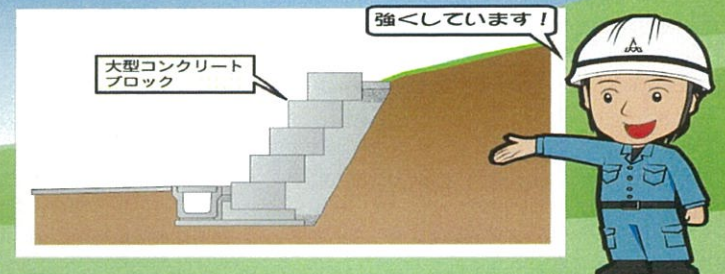

施工者
株式会社 相岡組 TEL:0584-27-3140
現場代理人: 中島 佑太 / 監理技術者: 後藤 美典

発注者
国土交通省 中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
工務課 TEL:058-251-1324
揖斐川第二出張所 TEL:0584-81-1034

進捗状況



工期: 令和2年12月14日~令和3年12月24日
