

揖斐川大村堤防補強工事だより

8月号




毎日暑い日が続いていますが、皆さん体調は如何でしょうか。現場では熱中症対策を万全に行っていますので、皆元気に仕事を行っています。

現場は8月は中間地点を施工していきます。30m毎に施工していますが少しずつ終点へ向かって前へ前へ進んでいます。対岸の伐木除根も8月末を目標に完了させる予定です。早期完成出来るようにこれからも頑張ってお仕事を行っています。

近隣住民の皆様には交通規制等で大変ご迷惑をお掛け致しますが**安全第一**で工事を行いますので、今月もどうか宜しくお願い致します。

現在の進捗状況

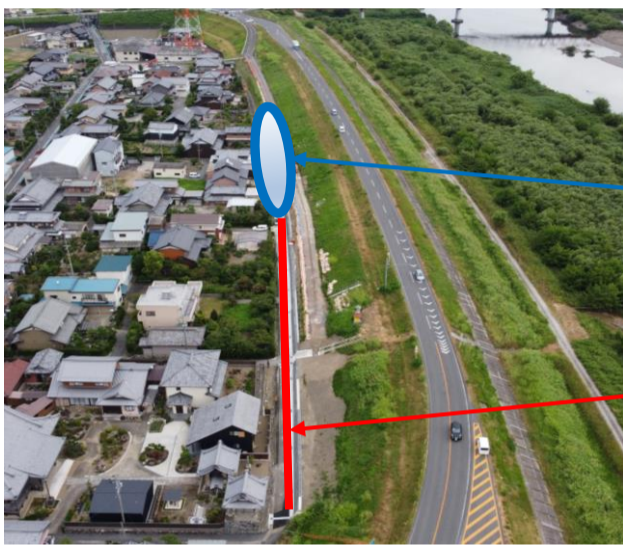

8月施工予定箇所
ブロック積・側溝据付

施工完了箇所
ブロック積・側溝・階段据付完了
(一部、舗装は除く)

施工状況

7月から対岸の伐木除根を行っています。河川内に大量に茂った樹木を伐採し、流水の支障を失くし安全に流下させる洪水対策を行う工事です。8月も大村地内のブロック積と対岸の伐採で同時に作業を進めていきます。



対岸の伐木除根箇所(着手前)



伐木除根作業状況

工事概要

発注者 国土交通省 中部地方整備局 木曾川上流河川事務所

施工 株式会社 相岡組

工事名 令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

工期 令和2年12月15日 ~ 令和3年12月24日


河川土工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 伐木除根 1式

堤脚保護工 コンクリートブロック工 A=503㎡ コンクリート基礎L=317m

付帯道路工 As舗装 A=174㎡ PU側溝 L=285m 自由勾配側溝 L=32m 暗渠(1号~6号各1箇所)

堤防強化のため法尻を補強する工事を行っています

令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

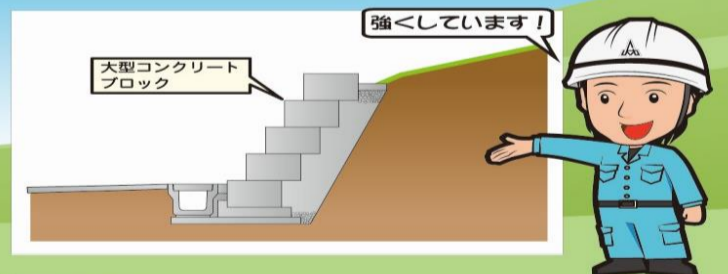

施工者

株式会社 相岡組 TEL:0584-27-3140
現場代理人: 中島 佑太 / 監理技術者: 後藤 美典

発注者

国土交通省 中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
工務課 TEL:058-251-1324
揖斐川第二出張所 TEL:0584-81-1034

進捗状況



工期: 令和2年12月14日~令和3年12月24日
