

揖斐川大村堤防補強工事だより

11月号



非常に過ごしやすい季節になりました。秋の特有の風と日中の暖かさが現場にも安らぎを運んでくれます。現場作業員の動きも一段と活気が溢れています。ただ、朝晩は冷えこみも厳しい時もありますので、皆様も体調管理には十分に配慮して下さい。

さて11月の予定ですが、まず仮設道路の撤去を行い張芝の施工に入っていきます。張芝完了後は、舗装復旧を行い今月中には全作業工程が完了致します。

近隣住民の皆様には交通規制等で大変ご迷惑をお掛け致しますが**安全第一**で工事を行いますので、今月もどうか宜しくお願い致します。

現在の進捗状況


施工状況



11月施工予定箇所
仮設道路撤去・張芝
舗装復旧

施工完了箇所
ブロック積・側溝・階段据付完了
(一部、舗装は除く)

現在、ブロック積・側溝据付が全線完了し、順次仮設道路の撤去を行い、張芝の施工に入ります。張芝完了後は舗装復旧を行っていきます。今月末を目途に、全ての工事を完了させる予定です。

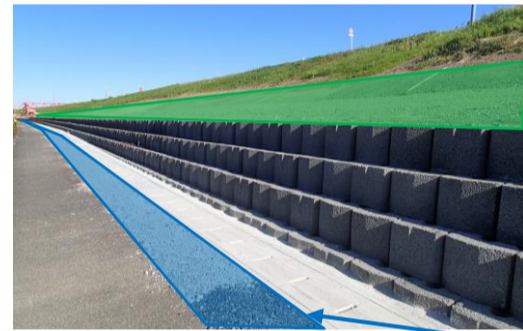

張芝施工箇所

舗装復旧箇所

工事概要

発注者 国土交通省 中部地方整備局 木曾川上流河川事務所

施工 株式会社 相岡組

工事名 令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

工期 令和2年12月15日 ~ 令和3年12月24日


河川土工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 伐木除根 1式

堤脚保護工 コンクリートブロック工 A=503m² コンクリート基礎L=317m

付帯道路工 As舗装 A=174m² PU側溝 L=285m 自由勾配側溝 L=32m 暗渠 (1号~6号各1箇所)

堤防強化のため法尻を補強する工事を行っています

令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

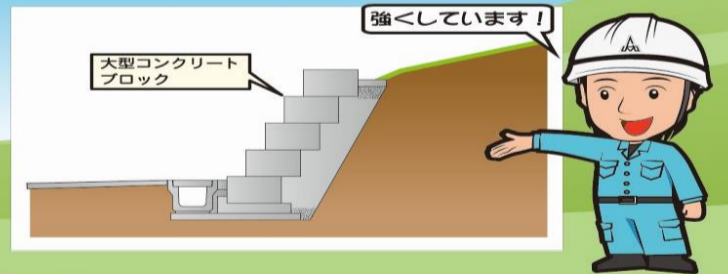

強くしています!

大型コンクリートブロック

施工者

株式会社 相岡組 TEL:0584-27-3140
現場代理人: 中島 佑太 / 監理技術者: 後藤 美典

発注者

国土交通省 中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
工務課 TEL:058-251-1324
揖斐川第二出張所 TEL:0584-81-1034

進捗状況



工期: 令和2年12月14日~令和3年12月24日
