

揖斐川大村堤防補強工事だより

5月号



4月は朝晩の寒さと日中の暖かさが入替る程の気温の波がありました、それも5月になると常に暖かさだけを感じる季節へと変わっていきます。
5月の施工予定ですが、工事区間の起点（順行寺様前）より階段復旧箇所（水神様前）までの間を完了する事を目標に進めて参ります。堤脚ブロック及びU型側溝据付を行い完了させていきます。

近隣住民の皆様には交通規制等で大変ご迷惑をお掛け致しますが**安全第一**で工事を行いますので、今月もどうか宜しくお願い致します。

現在の進捗状況



起点箇所から
施工をしています。

ヘキサゴン（今回、使用するコンクリートブロック）

ヘキサゴンは、ブロック間の一体性を増し、土圧に対する十分な安定性と壁体強度を確保しているブロックです。

また、ポーラスコンクリートの特徴である透水性や保水性による湿潤環境を確保し、景観性や緑化機能等の特徴を持つ多自然型ブロックです。

ヘキサゴン据付施工状況（例）



工事概要

発注者 国土交通省 中部地方整備局 木曾川上流河川事務所

施工 株式会社 相岡組

工事名 令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

工期 令和2年12月15日 ~ 令和3年6月30日


河川土工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

堤脚保護工 コンクリートブロック工 A=503㎡ コンクリート基礎L=317m

付帯道路工 As舗装 A=174㎡ PU側溝 L=285m 自由勾配側溝 L=32m 暗渠（1号~6号各1箇所）

堤防強化のため法尻を補強する工事を行っています

令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

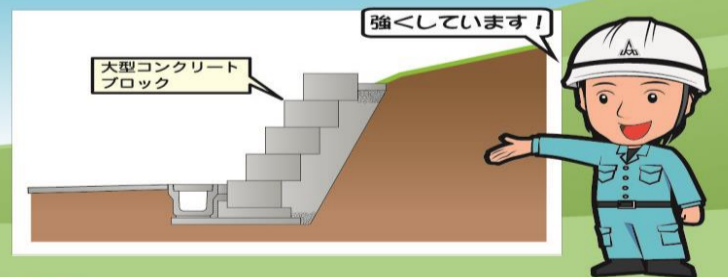

施工者
株式会社 相岡組 TEL:0584-27-3140
現場代理人：中島 佑太 / 監理技術者：後藤 美典

発注者
国土交通省 中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
工務課 TEL:058-251-1324
揖斐川第二出張所 TEL:0584-81-1034

進捗状況



工期：令和2年12月14日~令和3年6月30日
