

牧田川船附築堤護岸だより

1月号



新年明けましておめでとうございます。今年はとても暖かい新年を迎えました。12月に雪の降らなかった年はなかなか無いのではないのでしょうか？これも異常気象の関係でしょうか？もしかするとこの冬は1度も雪が降らずに過ぎて行くかも知れませんね。暖かいといっても現場の方は、「伊吹おろし」の冷たい風を浴びながらの施工ですが、無事故・無災害を目標に日々安全作業に努めています。昨年と同様に本年もどうか宜しくお願い致します。

現在までの進捗状況と1月の施工予定

12月から堤防法面の表土掘削及び良質土による盛土の施工を行っています。そして、高水箇所でのプレキャスト基礎の施工も行っています。1月はプレキャスト基礎工の施工を継続しながら、プレキャストコンクリート張の施工を行っていきます。近隣住民の皆様には、工事車両の通行や現場への出入り等で大変ご迷惑をお掛けしておりますが、どうか宜しくお願い致します。

建災防岐阜県支部安全講習会実施

建設業労働災害防止協会 岐阜県支部から講師をお招きし、「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」を実施しました。講習会では午前中、デスクスタディーとして、現場での安全ルールや現地KYの必要性、作業現場における危険予知などや作業時の決めごと等を再確認しました。また午後からは船附の現場へ移動し、現地KY・重機の死角確認やグーパー運動の実施・作業半径の確認を行いました。現場での講習では、作業現場で日々行わなければならない実践的な安全活動を再度確認する事が出来ました。

作業が慣れてくると注意が疎かになり、事故を起こしてしまう事例もある事から今のこの時期に安全講習会を開催した事により、我々現場の管理者や現場の作業員の方々と安全意識の向上を図る事が出来て良かったと思います。



デスクスタディー状況



現地KYとグーパー運動の実施状況

進捗率 46% (12月末)

12月の作業風景(築堤盛土)

敷均し状況




転圧状況



盛土完了



平面図から見る工事の進捗状況

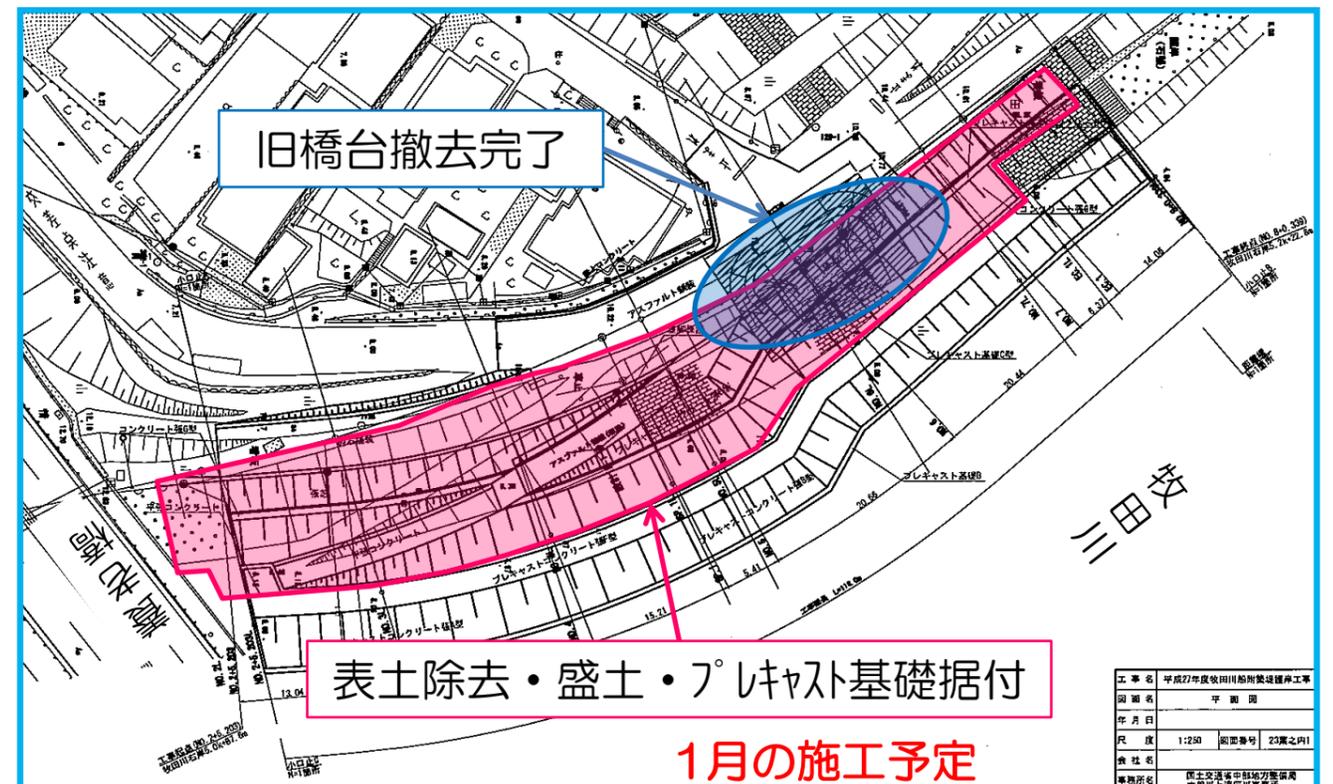

工事名	平成27年度牧田川船附築堤護岸工事
図面名	平面図
年月日	
尺度	1:200 図面番号 23第之P1
会社名	
事務所	国土交通省中部地方整備局 木曾川上流河川事務所 牧田川出張所

近隣地域の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしております。安全に作業致しますので、どうか宜しくお願い致します。

