

揖斐川大村堤防補強工事だより

10月号



9月は雨も少なく天候にも恵まれたそんな1ヶ月でした。次第に秋の匂いが我々の現場にも漂うようになってきて、秋の虫の声も響くようになりました。猛暑から解放され涼しさを感じられる季節へと変わって行くところこの工事最終段階に入っていきます。まだまだ、工事は残っていますので今月も頑張ってお参ります。

さて、10月の予定ですがブロック積・側溝据付を今月中に完了したいと思っています。近隣住民の皆様には交通規制等で大変ご迷惑をお掛け致しますが**安全第一**で工事を行いますので、今月もどうか宜しくお願い致します。

現在の進捗状況



10月施工予定箇所
ブロック積・側溝据付

施工完了箇所
ブロック積・側溝・階段据付完了
(一部、舗装は除く)

施工状況

現在、施工延長の7割程度が完了しており、約60mのブロック積と側溝の据付が残る程度となりました。10月も継続し施工してまいります。ブロック積と側溝の据付が完了したら、仮設道路の撤去、道路の舗装復旧に入っていきます。



終点から起点を望む



中間点から終点を望む

工事概要

発注者 国土交通省 中部地方整備局 木曾川上流河川事務所

施工 株式会社 相岡組

工事名 令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

工期 令和2年12月15日 ~ 令和3年12月24日


河川土工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 伐木除根 1式

堤脚保護工 コンクリートブロック工 A=503㎡ コンクリート基礎L=317m

付帯道路工 As舗装 A=174㎡ PU側溝 L=285m 自由勾配側溝 L=32m 暗渠(1号~6号各1箇所)

堤防強化のため法尻を補強する工事を行っています

令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

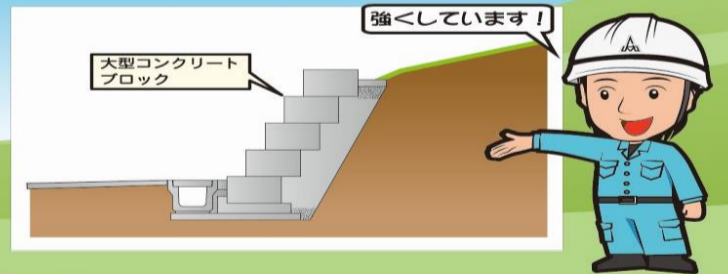

施工者

株式会社 相岡組 TEL:0584-27-3140
現場代理人: 中島 佑太 / 監理技術者: 後藤 美典

発注者

国土交通省 中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
工務課 TEL:058-251-1324
揖斐川第二出張所 TEL:0584-81-1034

進捗状況



工期: 令和2年12月14日~令和3年12月24日
